



Journée technique d'informations et d'échanges de l'A.R.R.A.

« Des études aux travaux »

ATELIER 3 : mise en œuvre des actions du contrat

Maison du fleuve Rhône - Givors

17 juin 2008

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





Lors du passage de la phase de programmation à la phase de réalisation, le chargé de mission d'une procédure de gestion concertée de cours d'eau se trouve confronté à un ensemble de difficultés d'ordre administratif, financier et technique auquel il est peu ou pas préparé

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux insuffisances et aux difficultés de l'exercice de programmation

⇒ sous-estimation « chronique » du coût prévisionnel des opérations
dans la programmation

⇒ insuffisance du diagnostic initial et/ou évolution de la situation sur
le terrain



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation

dû à la complexité, la multiplicité et la lourdeur des procédures administratives et autres démarches préalables

⇒ les missions de maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, d'assistance à maîtrise d'ouvrage

⇒ les autorisations réglementaires au titre de la L.E.M.A.

⇒ la maîtrise foncière ou la D.I.G.

⇒ les marchés publics



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation

dû à la complexité, la multiplicité et la lourdeur des procédures administratives et autres démarches préalables

⇒ l'inscription budgétaire et la délibération de la collectivité

⇒ la demande de subventions



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux travaux préparatoires aux chantiers



- ⇒ l'aménagement d'accès
- ⇒ la sécurisation du chantier
- ⇒ la régulation de la circulation



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux travaux préparatoires au chantier



⇒ l'abattage



- ⇒ le débroussaillage
- ⇒ la dépose de clôture
- ⇒ ... etc.

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.



L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux travaux préparatoires aux chantiers



⇒ les levés topographiques

⇒ les pêches de sauvetage avant travaux



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.



L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux travaux préparatoires aux chantiers

⇒ la mise hors d'eau du chantier



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.



L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux travaux connexes aux chantiers



exemple : déplacement d'un pylône M.T.

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû à l'inflation constante des prix

⇒ prix des matériaux



⇒ prix des carburants



⇒ coût de la main d'oeuvre

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû à l'évolution des politiques d'aide des partenaires financeurs

eaux de
Rhône-Méditerranée & Corse



Le dossier
Le 9^e programme
d'interventions
de l'agence de l'eau
est sur les rails

Sommaire

- ⇒ désengagement partiel ou total
- ⇒ sélectivité accrue des aides
- ⇒ plafonnement du montant des aides
- ⇒ baisse des taux d'aides
- ⇒ non prise en compte du montant de la T.V.A. dans le calcul des aides
- ⇒ ...etc.


Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû au renforcement de la réglementation et à son évolution permanente

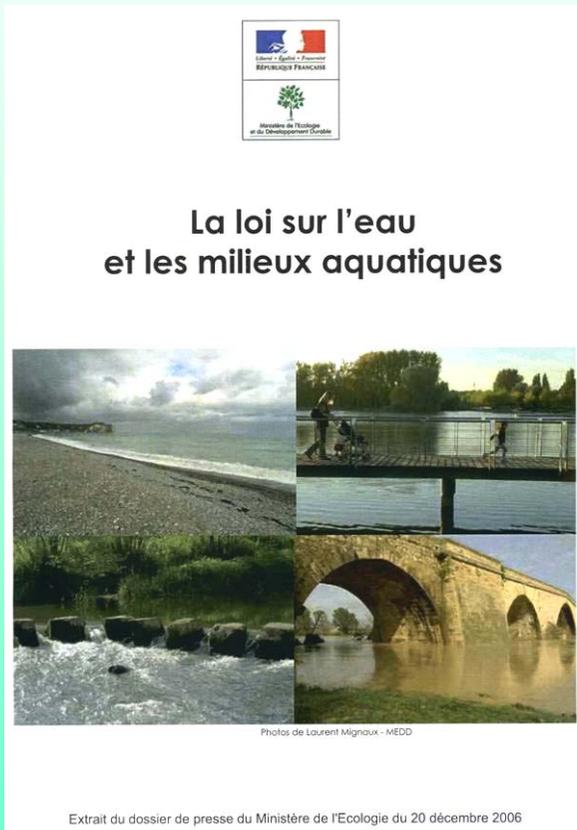

⇒ changement de statut des I.O.T.A. dans la nomenclature

⇒ application stricte du principe de précaution

⇒ ...etc.



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation inhérent aux spécificités du fonctionnement des collectivités locales

Elections municipales 2^e tour

Pierre Dumontet 253 voix, Gérard Poulernard 242 voix, Christian Giraud 237 voix, Sébastien Laval 234 voix, Carine Moreaud 218 voix, Christine Deprele 217 voix, Christian Verchere 217 voix, Christelle Scotti 215 voix, René Veaux 214 voix, Christine Dumord-Achaintre 211 voix, Marcel Bajard 203 voix, Paul Martin 200 voix. **Elus au 2^e tour** : Francine Raynaud 178 voix, Isabelle Durand 144 voix, Jean Augagneur 131 voix.

Theil

254 inscrits, 192 votants, 24,41 % d'abstention. **Elus au 2^e tour** : Yolande Aigle 136 voix, Olivier Dubouis 113 voix, Patrice Corgié 107 voix, Johannes Monte 103 voix, Emmanuel Ovisé 100 voix, Jeanine Coillard 85 voix, Bernadette Joly 83 voix, Franck Dubouis 80 voix, Bernard Chazelle 65 voix, Gilles Cherpin 64 voix, Renée Ovisé 58 voix.

Saint-Just-d'Avray

592 inscrits, 437 votants, 26,18 % d'abstention. **Elus au 1^{er} tour** : Georges Lacroix 324 voix, René Salembier 291 voix, Odile Doucet 285 voix, Christelle Gathier 273 voix, Jean-Michel Lerissel 265 voix, Geneviève Ferrand 260 voix, Alain Guillet-Loma 252 voix. **Elus au 2^e tour** : Maryline Dubost 254 voix, Stéphane Corgier 241 voix, Olivier Lacroix 239 voix, Hervé Goujat 201 voix, Sylvain Kasprzyk 197 voix, Catherine Moucaud 197 voix, Franck Ronzon 173 voix, Annie Corgier 169 voix.

Ranchal

287 inscrits, 216 votants, 24,74 % d'abstention. **Elus au 1^{er} tour** : Denis Longin 165 voix, Pascale Burnichon 140 voix, Christian Perrier 138 voix, Marie-Claude Depavin 131 voix, Eliane Bernard 124 voix, Franck Ronzon 100 voix, Franck Ronzon 100 voix, Franck Ronzon 100 voix.

Theizé

889 inscrits, 564 votants, 36,56 % d'abstention. **Elus au 1^{er} tour** : Yves Moriaud 406 voix, Jean-Yves Large 400 voix, Christian Vivier-Mérle 389 voix, Catherine Bonnepart 373 voix, Isabelle Granjon 366 voix, Maxime Poyet 366 voix, Laure Roosen 346 voix, Severine Azria 346 voix, Bernard Bourbon 342 voix, Christian Darricau 331 voix, Bettyna Grimaud 325 voix, Marie-Claude Valleix 323 voix, Dominique Bernard 322 voix. **Elus au 2^e tour** : René Clavel 281 voix, Michel Herrmann 219 voix.

Ville-sur-Jarnioux

575 inscrits, 418 votants, 27,30 % d'abstention. **Elus au 1^{er} tour** : Roselyne Loyat 264 voix, Antoine Mathieu 252 voix, Maurice Lièvre 250 voix, Claire Laverrière 249 voix, Yvette Gay 249 voix, Michel Jacquet 244 voix, Elodie Couturier 241 voix, Jean-Pierre Dugelay 239 voix, Jacques Bouvier 239 voix. **Elus au 2^e tour** : Lor Verhoef 222 voix, René Socchi 214 voix, Claire Herssens 209 voix, Martin Tresca 199 voix, Sophie Savoye 199 voix, Martine Blais 194 voix.

Haut-Beaujolais

Aigueperse

232 inscrits, 152 votants, 34,48 % d'abstention. **Elus au 1^{er} tour** : Alain Forest 115 voix, Hervé Oriot 112 voix, Thierry Serres 104 voix, André Vouillon 102 voix, Roland Lefevre 91 voix. **Elus au 2^e tour** : Jean-Louis Duranton 78 voix, Nathanaelle Routin 70 voix, Madeleine Ogier 67 voix, Jérôme Champouret 66 voix, Jean Micanel 66 voix, Pascale Cortambert 61 voix.

⇒ « flottements » ou tensions en période électorale

⇒ défection de certains maîtres d'ouvrages

⇒ possible remise en cause d'un projet

⇒ ...etc.

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû aux difficultés du travail en rivière



⇒ hydrologie ou météo défavorables



⇒ survenance d'une crue

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation

lié au calendrier de la nature



⇒ frai du poisson

⇒ période de repos végétatif



⇒ nidification des oiseaux

⇒ ... etc.

Pierre GADIOLET


Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû à des éléments perturbateurs extérieurs

⇒ vandalisme, vol, incivilités, ...etc.

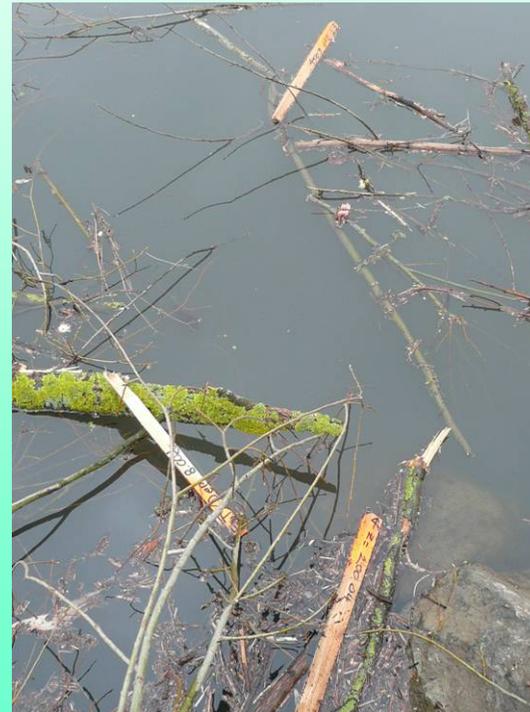

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.



L'inévitable dérapage du coût et des délais de réalisation dû à l'intervention publique sur des propriétés privées

- ⇒ négociation avec les riverains
- ⇒ conventions, D.I.G.
- ⇒ acquisition foncière
- ⇒ abandon ou cession du droit d'eau
- ⇒ expropriation
- ⇒ ...etc.



Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.





Malgré toutes ces difficultés, avec un peu de persévérance et de ténacité, un zeste d'audace, un doigt de persuasion et une bonne dose de conviction et de passion on arrive tout de même à réaliser quelques belles opérations, alors courage, tenez bon, çà en vaut la peine !

Pierre GADIOLET

Chargé de mission du Contrat de Rivière Azergues - S.M.R.P.C.A.

